

DEKiTA



DESSAU-ROSSLAUER KINDERTAGESSTÄTTEN



Anlage 2

TOP 7.2.3

Aktueller Stand der Bauvorhaben

Doreen Rach

Betriebsleiterin



BA, 11.05.2017

Übersicht


Stark III:	<ul style="list-style-type: none">- Kita „Mildenseer Spielbude“- Kita „Luisenkinder“- Kita „Bremer Stadtmusikanten“- Hort „Waldwichtel“ Fliederweg	Förderantrag abgegeben in Planung in Planung in Planung
Krippenausbau:	<ul style="list-style-type: none">- Kita „Fuchs & Elster“- Kita „Spielhaus“- Kita „Kinderland“- Kita „Nesthäkchen“	in Ausführung in Ausführung Ausführung beginnt Ausführung beginnt
Sonstige:	<ul style="list-style-type: none">- Essener Straße- Kita „Sausewind“ Fenster- Erweiterung Hort „Waldwichtel“- Jugendklub „Platte 15“	Planungsvorbereitung in Ausführung Planung geändert ruht (Entscheidung Standort abwarten)

Stark III – Kita „Luisenkinder“

- Entwurfskonzept liegt vor
- Ämterrunde abgeschlossen
- im Gestaltungsbeirat vorgestellt positiv bewertet
- Kosten zur Prüfung vorgelegt
- Prüfung in Arbeit
- Abgabe 30.06.2017

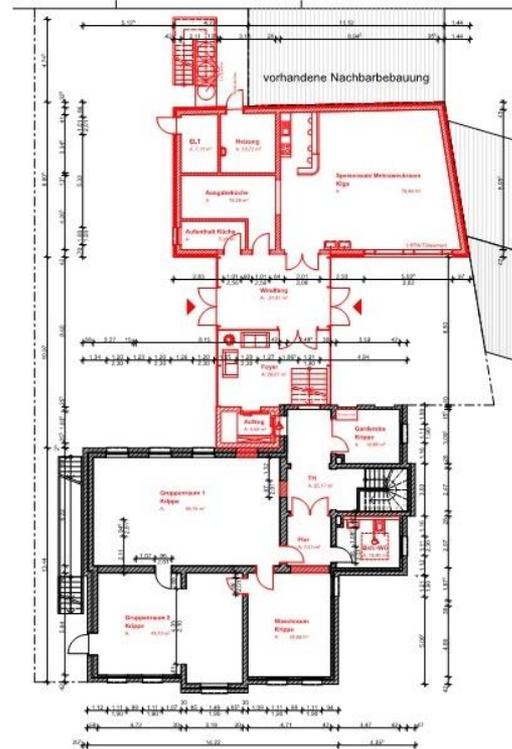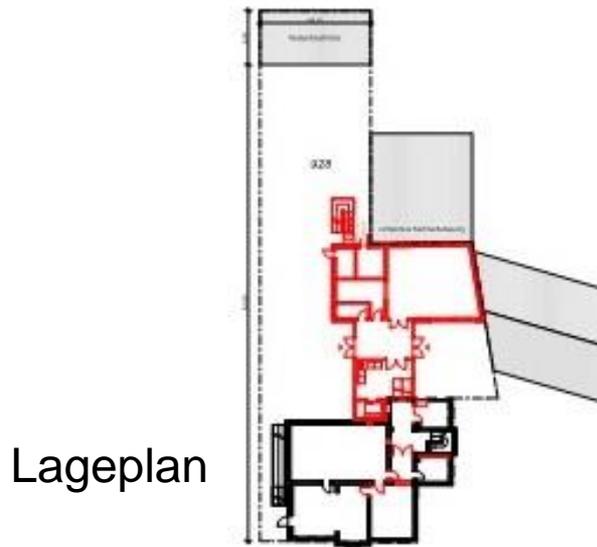

Grundriss
Erdgeschoss

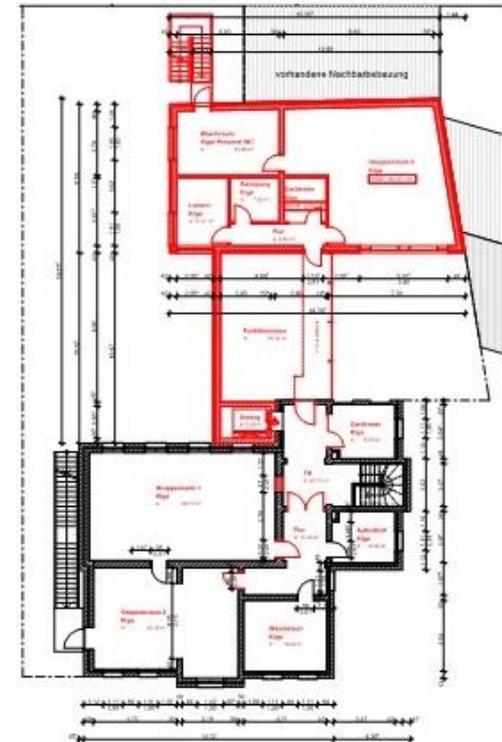


Grundriss
Obergeschoss

Stark III – „Bremer Stadtmusikanten“


- Entwurfskonzept liegt vor
- Fachplaner ergänzen Lösung
- Ämterrunde abgeschlossen
- zum Gestaltungsbeirat am 04.05.2017 eingereicht
- Vorlage der Antrags 08.05.2017
- Unterschrift Herr Kuras 11.05.2017
- Abgabe 15.05.2017



Lageplan

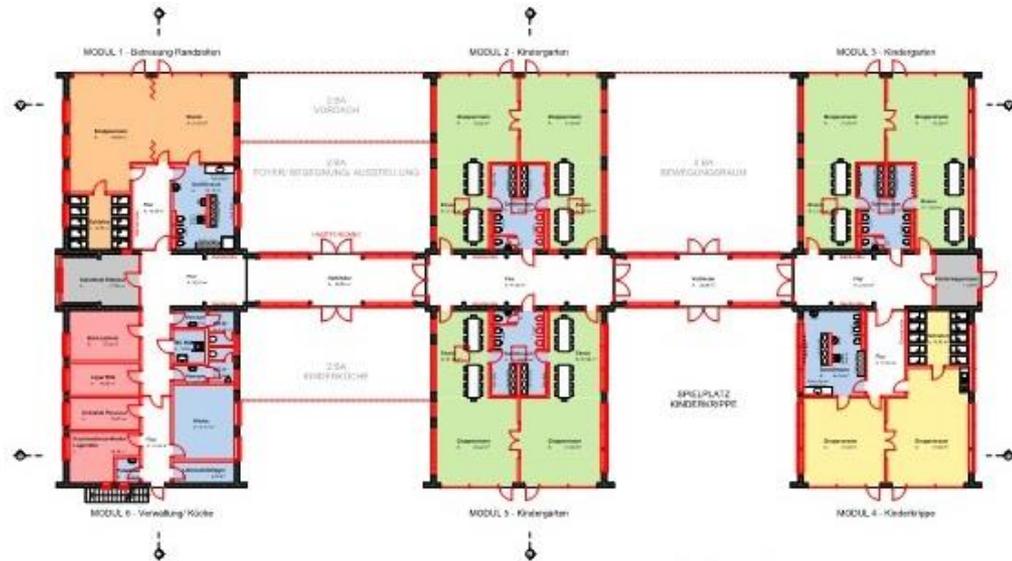


Grundriss Erdgeschoss



Schnitt

Stark III – „Waldwichtel“

- Entwurfskonzept liegt vor
- Fachplaner ergänzen Lösung
- Ämterrunde abgeschlossen
- zum Gestaltungsbeirat am 04.05.2017 eingereicht
- Vorlage der Antrags 08.05.2017
- Unterschrift Herr Kuras 11.05.2017
- Abgabe 15.05.2017

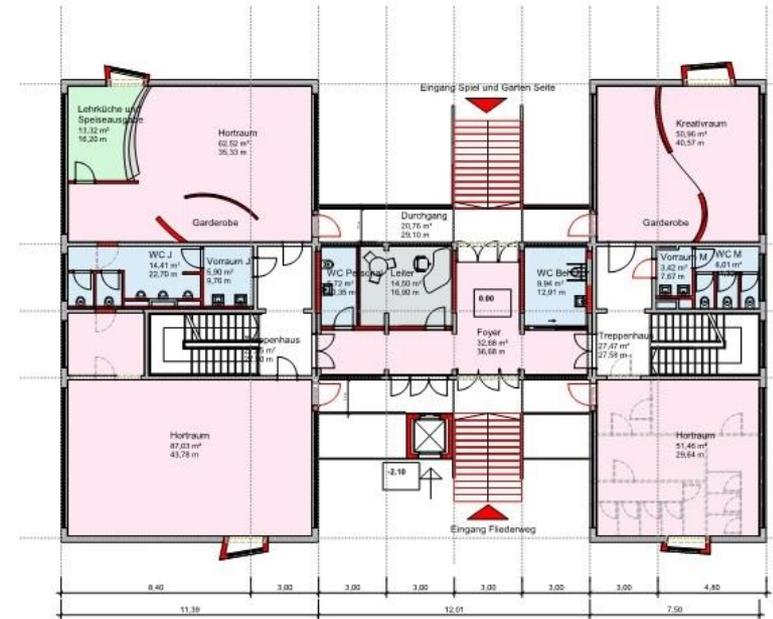

Grundriss Erdgeschoss

Grundriss Obergeschoss



Krippenausbau – Stand

- Fuchs & Elster
 - Essenaufzug abgeschlossen 23.03.2017
 - 2. Rettungsweg in Ausführung
 - Fertigstellung 31.05.2017
- Spielhaus
 - Einbau Fluchttüren 24.04.2017
 - Montage Balkon 24.04.2017
 - Fertigstellung 31.05.2017



Krippenausbau – Stand

- Kinderland

- Essenaufzug beginnt 03.05.2017
- Übergabe 17.05.2017
- 2. Rettungsweg beginnt 18.05.2017
- Fertigstellung 31.08.2017

- Nesthäkchen

- 2. Rettungsweg beginnt 06.06.2017
- Fertigstellung 31.08.2017



